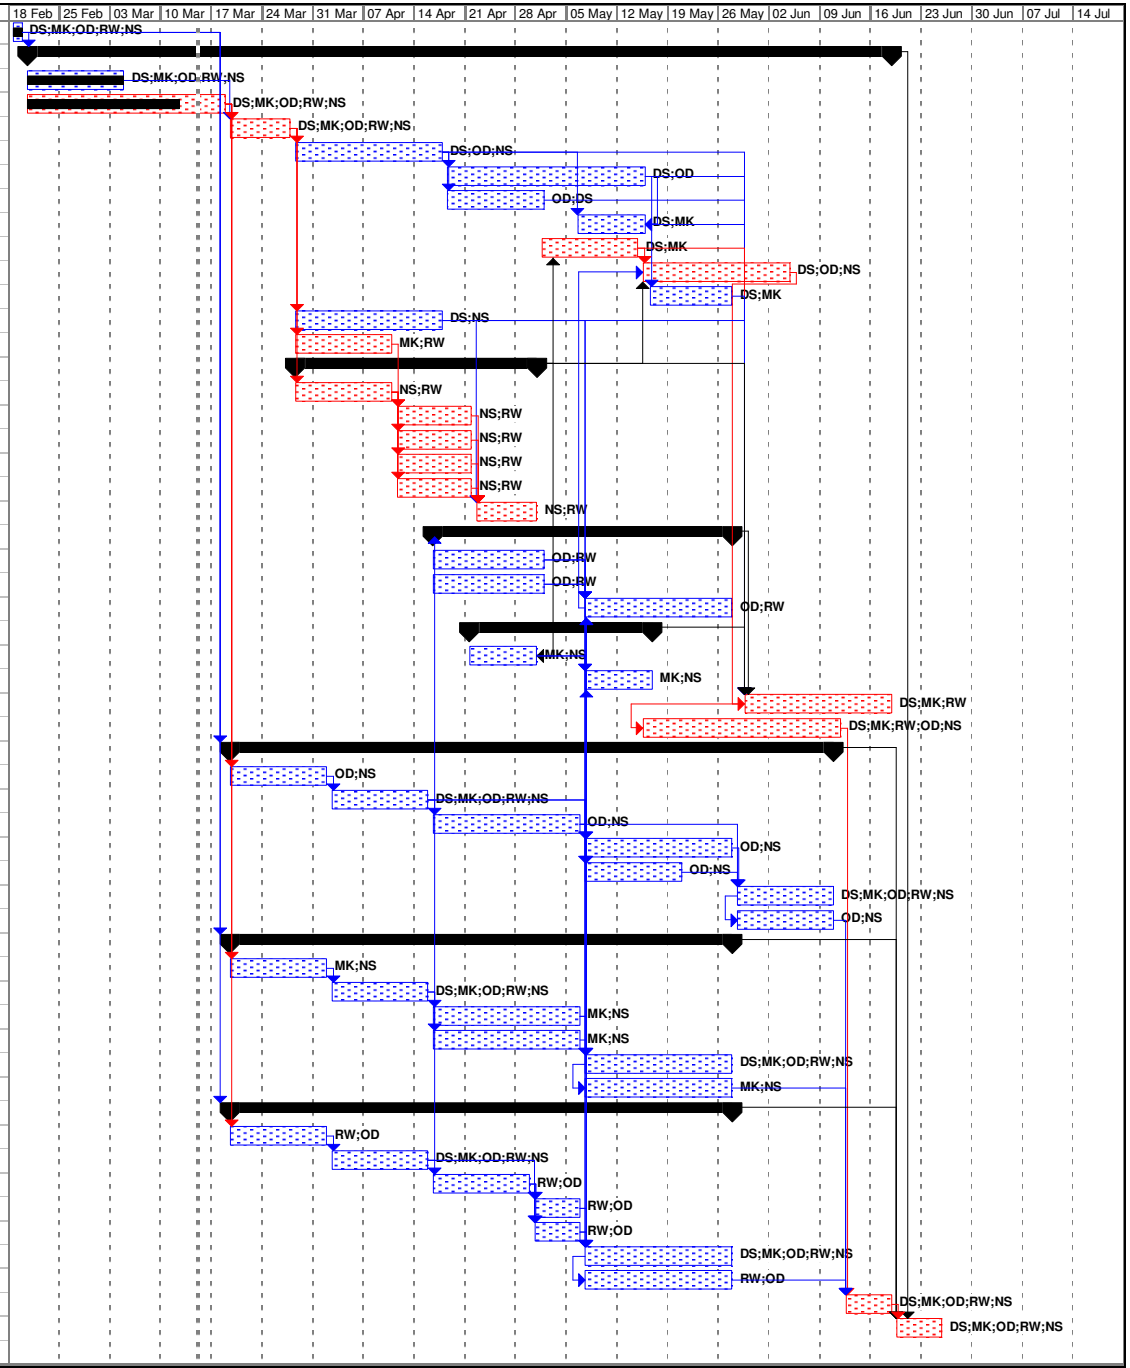ID		Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1	✓	Preparation	2 days	Mon 18.02.08	Tue 19.02.08		DS;MK;OD;RW;NS
2		**Mobile application**	**86 days**	**Wed 20.02.08**	**Wed 18.06.08**	**1**	
3	✓	Review of current code	10 days	Wed 20.02.08	Tue 04.03.08		DS;MK;OD;RW;NS
4		Analysis	20 days	Wed 20.02.08	Tue 18.03.08		DS;MK;OD;RW;NS
5		Analysis review	7 days	Wed 19.03.08	Thu 27.03.08	4;3	DS;MK;OD;RW;NS
6		Vector map storage	15 days	Fri 28.03.08	Thu 17.04.08	5	DS;OD;NS
7		Vector map display	20 days	Fri 18.04.08	Thu 15.05.08	6	DS;OD
8		POI storage and search	10 days	Fri 18.04.08	Thu 01.05.08	6	OD;DS
9		Waypoints, including navigation	8 days	Tue 06.05.08	Thu 15.05.08	6;7FF	DS;MK
10		Track storage	10 days	Thu 01.05.08	Wed 14.05.08	15	DS;MK
11		External data display	15 days	Thu 15.05.08	Wed 04.06.08	15;10;25SS+5 day	DS;OD;NS
12		Extra display functionality	8 days	Fri 16.05.08	Tue 27.05.08	7	DS;MK
13		Configuration interface	15 days	Fri 28.03.08	Thu 17.04.08	5	DS;NS
14		Bluetooth communication	10 days	Fri 28.03.08	Thu 10.04.08	5	MK;RW
15		**GPS communication**	**24 days**	**Fri 28.03.08**	**Wed 30.04.08**		
16		General	10 days	Fri 28.03.08	Thu 10.04.08	5	NS;RW
17		Bluetooth	7 days	Fri 11.04.08	Mon 21.04.08	16;14	NS;RW
18		LAPI	7 days	Fri 11.04.08	Mon 21.04.08	16	NS;RW
19		Serial	7 days	Fri 11.04.08	Mon 21.04.08	16	NS;RW
20		Simulator	7 days	Fri 11.04.08	Mon 21.04.08	16	NS;RW
21		Testing	7 days	Tue 22.04.08	Wed 30.04.08	17;18;20;19;13	NS;RW
22		**Communication with the server**	**30 days**	**Wed 16.04.08**	**Tue 27.05.08**	**48**	
23		Position sending	12 days	Wed 16.04.08	Thu 01.05.08		OD;RW
24		Buddy position requests	12 days	Wed 16.04.08	Thu 01.05.08		OD;RW
25		Testing	15 days	Wed 07.05.08	Tue 27.05.08	23;24;50;51;13	OD;RW
26		**Communication with the desktop**	**20 days**	**Mon 21.04.08**	**Fri 16.05.08**		
27		Implementation	8 days	Mon 21.04.08	Wed 30.04.08	15FF	MK;NS
28		Testing	8 days	Wed 07.05.08	Fri 16.05.08	27;42;13	MK;NS
29		Testing	15 days	Thu 29.05.08	Wed 18.06.08	6;7;8;15;22;9;26;1	DS;MK;RW
30		Documentation	20 days	Thu 15.05.08	Wed 11.06.08	29SS-10 days	DS;MK;RW;OD;NS
31		**Desktop application - data preparation**	**60 days**	**Wed 19.03.08**	**Tue 10.06.08**	**1**	
32		Analysis	10 days	Wed 19.03.08	Tue 01.04.08	4	OD;NS
33		Analysis review	10 days	Wed 02.04.08	Tue 15.04.08	32	DS;MK;OD;RW;NS
34		Map cutting	15 days	Wed 16.04.08	Tue 06.05.08	33	OD;NS
35		Map indexing	15 days	Wed 07.05.08	Tue 27.05.08	33;34	OD;NS
36		POI indexing	10 days	Wed 07.05.08	Tue 20.05.08	33;34	OD;NS
37		Testing	10 days	Wed 28.05.08	Tue 10.06.08	34;35;36	DS;MK;OD;RW;NS
38		Documentation	10 days	Wed 28.05.08	Tue 10.06.08	37SS	OD;NS
39		**Desktop application - data transfer**	**50 days**	**Wed 19.03.08**	**Tue 27.05.08**	**1**	
40		Analysis	10 days	Wed 19.03.08	Tue 01.04.08	4	MK;NS
41		Analysis review	10 days	Wed 02.04.08	Tue 15.04.08	40	DS;MK;OD;RW;NS
42		Communication with the mobile	15 days	Wed 16.04.08	Tue 06.05.08	41	MK;NS
43		External data processing	15 days	Wed 16.04.08	Tue 06.05.08	41	MK;NS
44		Testing	15 days	Wed 07.05.08	Tue 27.05.08	42;43;27	DS;MK;OD;RW;NS
45		Documentation	15 days	Wed 07.05.08	Tue 27.05.08	44SS	MK;NS
46		**Server application**	**50 days**	**Wed 19.03.08**	**Tue 27.05.08**	**1**	
47		Analysis	10 days	Wed 19.03.08	Tue 01.04.08	4	RW;OD
48		Analysis review	10 days	Wed 02.04.08	Tue 15.04.08	47	DS;MK;OD;RW;NS
49		Data storage	10 days	Wed 16.04.08	Tue 29.04.08	48	RW;OD
50		Receive/store	5 days	Wed 30.04.08	Tue 06.05.08	48;49	RW;OD
51		Process request/Send	5 days	Wed 30.04.08	Tue 06.05.08	48;49	RW;OD
52		Testing	15 days	Wed 07.05.08	Tue 27.05.08	50;51;23;24	DS;MK;OD;RW;NS
53		Documentation	15 days	Wed 07.05.08	Tue 27.05.08	52SS	RW;OD
54		Testing/Documentation review	5 days	Thu 12.06.08	Wed 18.06.08	30;38;45;53	DS;MK;OD;RW;NS
55		Final report	5 days	Thu 19.06.08	Wed 25.06.08	2;31;39;46;54	DS;MK;OD;RW;NS
56		Desired finish date	0 days	Fri 08.08.08	Fri 08.08.08
