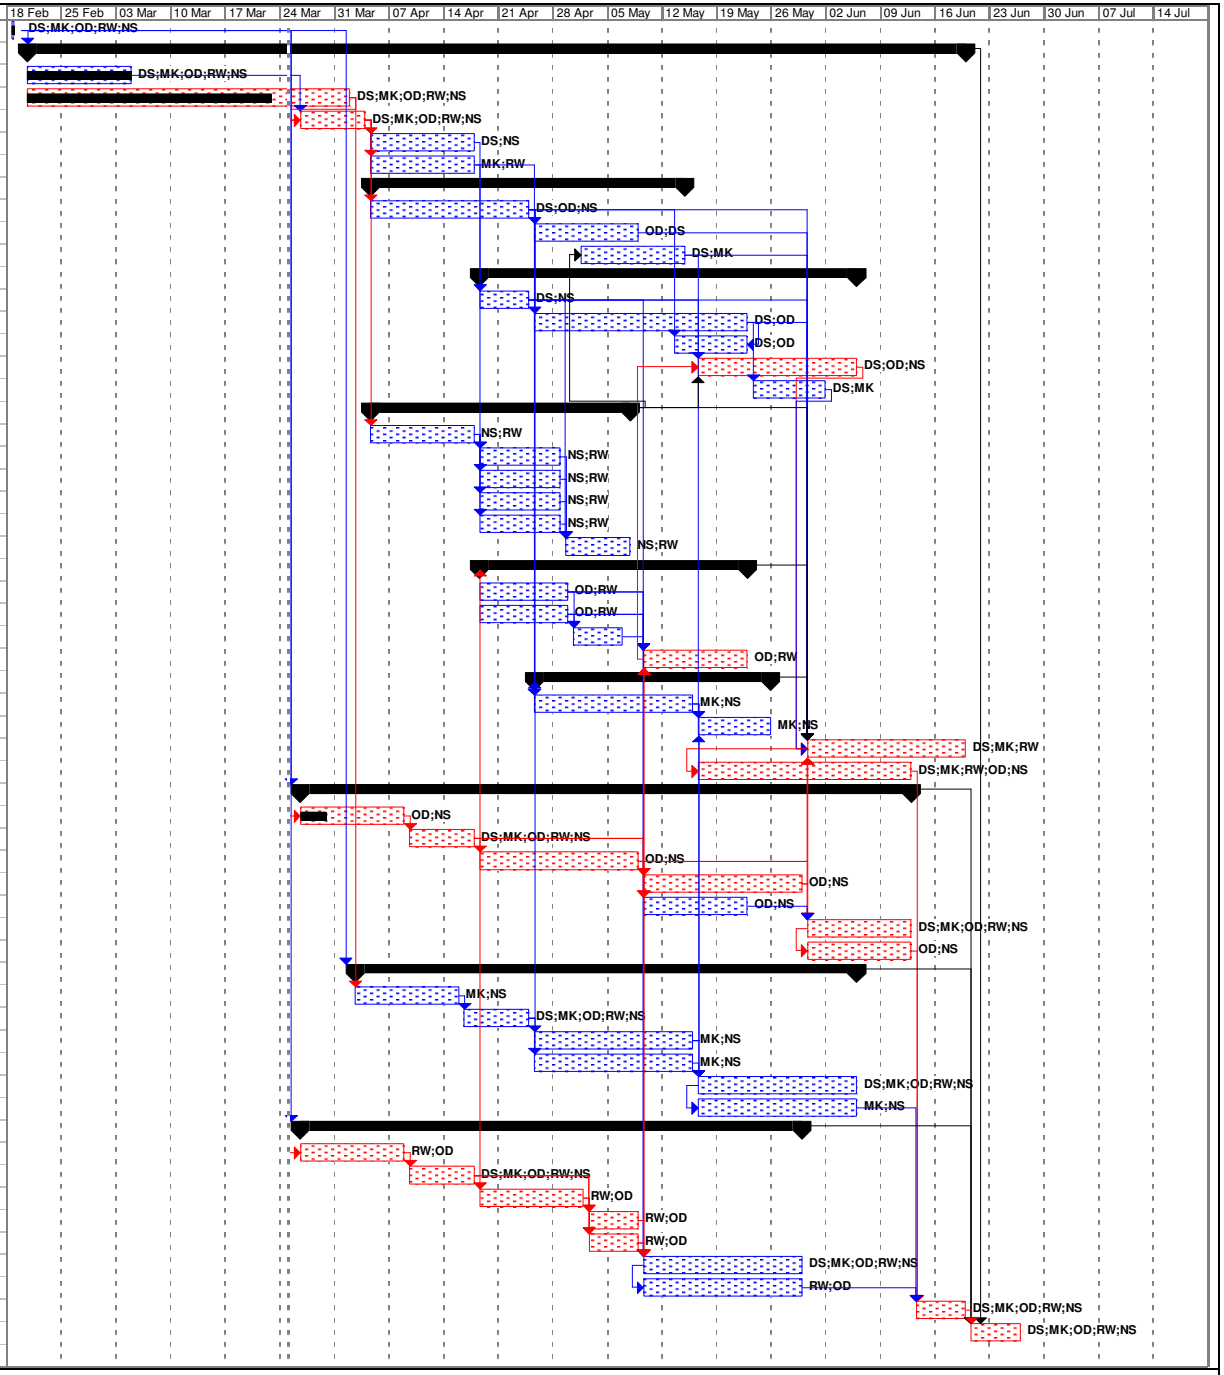ID		Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1	✓	Preparation	2 days	Mon 18.02.08	Tue 19.02.08		DS;MK;OD;RW;NS
2		**Mobile application**	**121 days**	**Wed 20.02.08**	**Thu 19.06.08**	**1**	
3	✓	Review of current code	14 days	Wed 20.02.08	Tue 04.03.08		DS;MK;OD;RW;NS
4		Analysis	42 days	Wed 20.02.08	Tue 01.04.08		DS;MK;OD;RW;NS
5		Analysis review	9 days	Wed 26.03.08	Thu 03.04.08	4FS-7 days;3	DS;MK;OD;RW;NS
6		Application core	14 days	Fri 04.04.08	Thu 17.04.08	5	DS;NS
7		Bluetooth communication	14 days	Fri 04.04.08	Thu 17.04.08	5	MK;RW
8		**Data storage and seach**	**41 days**	**Fri 04.04.08**	**Wed 14.05.08**		
9		Data storage	21 days	Fri 04.04.08	Thu 24.04.08	5	DS;OD;NS
10		POI search	14 days	Fri 25.04.08	Thu 08.05.08	9	OD;DS
11		Current track storage	14 days	Thu 01.05.08	Wed 14.05.08	18FS-7 days	DS;MK
12		**User interface**	**49 days**	**Fri 18.04.08**	**Thu 05.06.08**		
13		Configuration interface	7 days	Fri 18.04.08	Thu 24.04.08	6	DS;NS
14		Vector map display	28 days	Fri 25.04.08	Thu 22.05.08	9	DS;OD
15		Navigation	10 days	Tue 13.05.08	Thu 22.05.08	9;14FF	DS;OD
16		External data display	21 days	Fri 16.05.08	Thu 05.06.08	18;11;29SS+7 day	DS;OD;NS
17		Extra display functionality	10 days	Fri 23.05.08	Sun 01.06.08	14	DS;MK
18		**GPS communication**	**34 days**	**Fri 04.04.08**	**Wed 07.05.08**		
19		General	14 days	Fri 04.04.08	Thu 17.04.08	5	NS;RW
20		Bluetooth	11 days	Fri 18.04.08	Mon 28.04.08	19;7	NS;RW
21		LAPI	11 days	Fri 18.04.08	Mon 28.04.08	19	NS;RW
22		Serial	11 days	Fri 18.04.08	Mon 28.04.08	19	NS;RW
23		Simulator	11 days	Fri 18.04.08	Mon 28.04.08	19	NS;RW
24		Testing	9 days	Tue 29.04.08	Wed 07.05.08	20;21;23;22;13	NS;RW
25		**Communication with the server**	**35 days**	**Fri 18.04.08**	**Thu 22.05.08**	**52**	
26		Position sending	12 days	Fri 18.04.08	Tue 29.04.08		OD;RW
27		Buddy position requests	12 days	Fri 18.04.08	Tue 29.04.08		OD;RW
28		Parking tracking	7 days	Wed 30.04.08	Tue 06.05.08	26;27	
29		Testing	14 days	Fri 09.05.08	Thu 22.05.08	54;55;13;26;27;28	OD;RW
30		**Communication with the desktop**	**31 days**	**Fri 25.04.08**	**Sun 25.05.08**	**45**	
31		Implementation	21 days	Fri 25.04.08	Thu 15.05.08	9;7	MK;NS
32		Testing	10 days	Fri 16.05.08	Sun 25.05.08	31;46;13	MK;NS
33		Testing	21 days	Fri 30.05.08	Thu 19.06.08	9;14;10;18;25;30;1	DS;MK;RW
34		Documentation	28 days	Fri 16.05.08	Thu 12.06.08	33SS-14 days	DS;MK;RW;OD;NS
35		**Desktop application - data preparation**	**79 days**	**Wed 26.03.08**	**Thu 12.06.08**	**1**	
36		Analysis	14 days	Wed 26.03.08	Tue 08.04.08	5SS	OD;NS
37		Analysis review	9 days	Wed 09.04.08	Thu 17.04.08	36	DS;MK;OD;RW;NS
38		Map cutting	21 days	Fri 18.04.08	Thu 08.05.08	37	OD;NS
39		Map indexing	21 days	Fri 09.05.08	Thu 29.05.08	37;38	OD;NS
40		POI indexing	14 days	Fri 09.05.08	Thu 22.05.08	37;38	OD;NS
41		Testing	14 days	Fri 30.05.08	Thu 12.06.08	38;39;40	DS;MK;OD;RW;NS
42		Documentation	14 days	Fri 30.05.08	Thu 12.06.08	41SS	OD;NS
43		**Desktop application - data transfer**	**65 days**	**Wed 02.04.08**	**Thu 05.06.08**	**1**	
44		Analysis	14 days	Wed 02.04.08	Tue 15.04.08	4	MK;NS
45		Analysis review	9 days	Wed 16.04.08	Thu 24.04.08	44	DS;MK;OD;RW;NS
46		Communication with the mobile	21 days	Fri 25.04.08	Thu 15.05.08	45	MK;NS
47		External data processing	21 days	Fri 25.04.08	Thu 15.05.08	45	MK;NS
48		Testing	21 days	Fri 16.05.08	Thu 05.06.08	46;47;31	DS;MK;OD;RW;NS
49		Documentation	21 days	Fri 16.05.08	Thu 05.06.08	48SS	MK;NS
50		**Server application**	**65 days**	**Wed 26.03.08**	**Thu 29.05.08**	**1**	
51		Analysis	14 days	Wed 26.03.08	Tue 08.04.08	5SS	RW;OD
52		Analysis review	9 days	Wed 09.04.08	Thu 17.04.08	51	DS;MK;OD;RW;NS
53		Data storage	14 days	Fri 18.04.08	Thu 01.05.08	52	RW;OD
54		Receive/store	7 days	Fri 02.05.08	Thu 08.05.08	52;53	RW;OD
55		Process request/Send	7 days	Fri 02.05.08	Thu 08.05.08	52;53	RW;OD
56		Testing	21 days	Fri 09.05.08	Thu 29.05.08	54;55;26;27	DS;MK;OD;RW;NS
57		Documentation	21 days	Fri 09.05.08	Thu 29.05.08	56SS	RW;OD
58		Testing/Documentation review	7 days	Fri 13.06.08	Thu 19.06.08	34;42;49;57	DS;MK;OD;RW;NS
59		Final report	7 days	Fri 20.06.08	Thu 26.06.08	2;35;43;50;58	DS;MK;OD;RW;NS
60		Desired finish date	0 days	Fri 08.08.08	Fri 08.08.08
