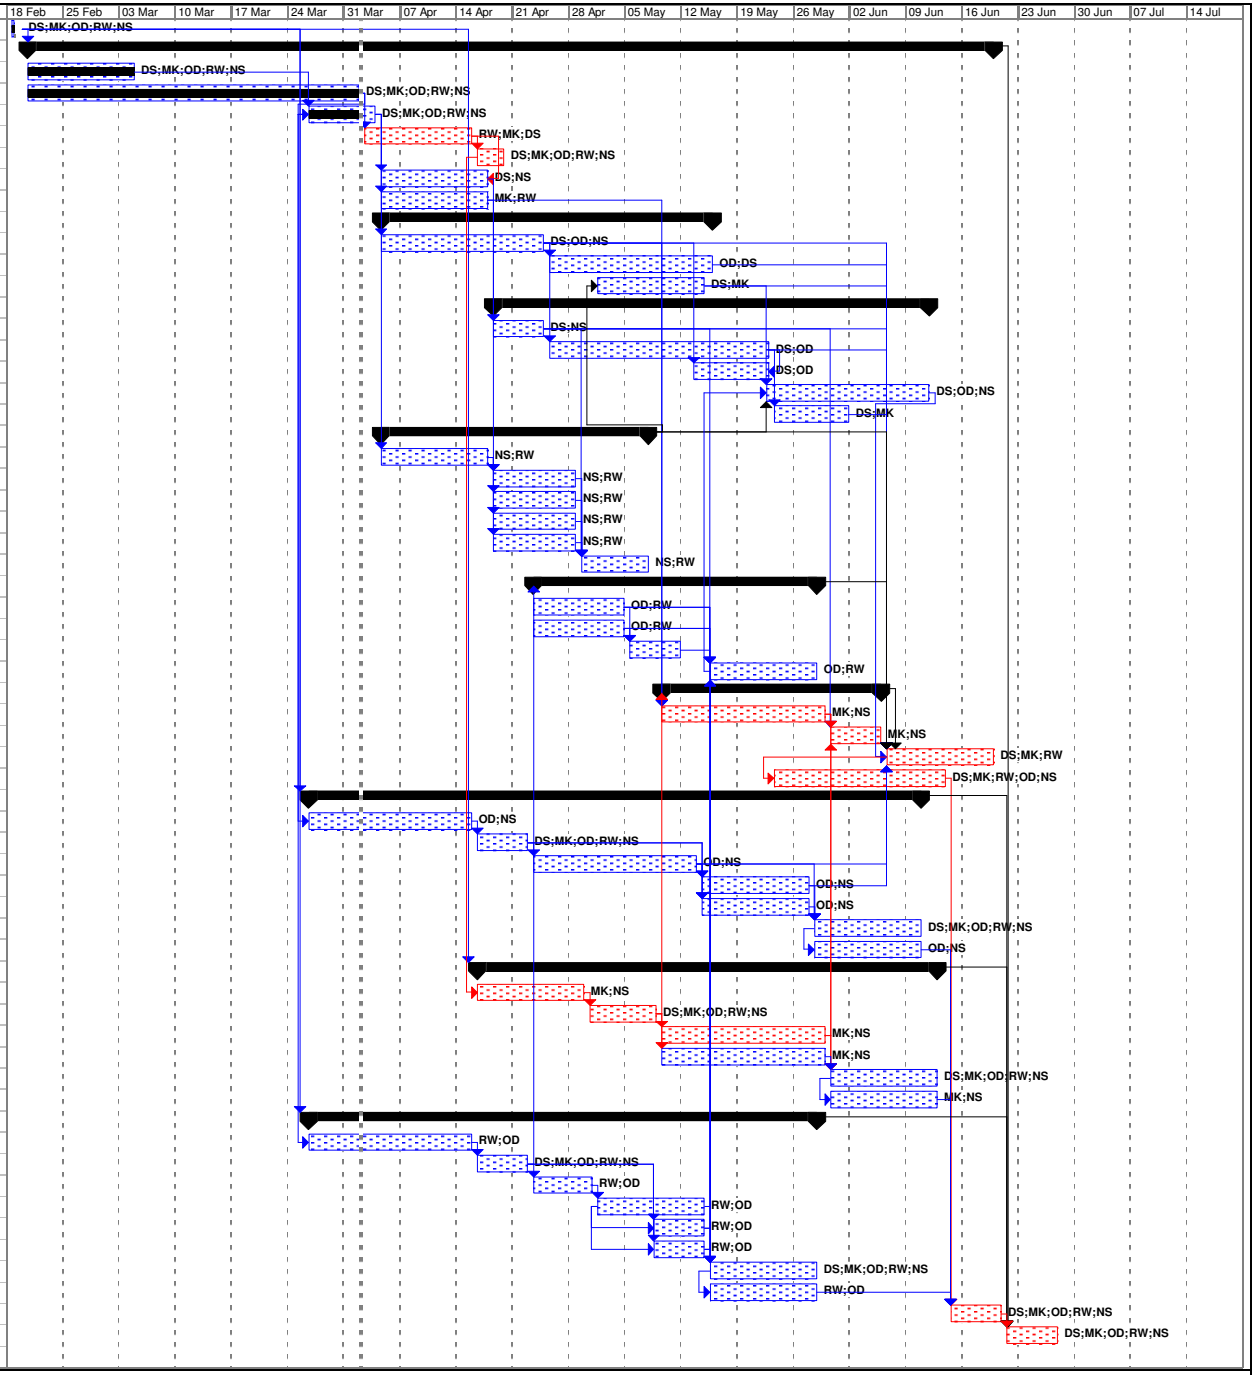ID		Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1	✓	Preparation	2 days	Mon 18.02.08	Tue 19.02.08		DS;MK;OD;RW;NS
2		**Mobile application**	**121 days**	**Wed 20.02.08**	**Thu 19.06.08**	**1**	
3	✓	Review of current code	14 days	Wed 20.02.08	Tue 04.03.08		DS;MK;OD;RW;NS
4	✓	Analysis	42 days	Wed 20.02.08	Tue 01.04.08		DS;MK;OD;RW;NS
5		Analysis review	9 days	Wed 26.03.08	Thu 03.04.08	4FS-7 days;3	DS;MK;OD;RW;NS
6		Analysis II	14 days	Wed 02.04.08	Tue 15.04.08	4	RW;MK;DS
7		Analysis review II	4 days	Wed 16.04.08	Sat 19.04.08	6	DS;MK;OD;RW;NS
8		Application core	14 days	Fri 04.04.08	Thu 17.04.08	5;6FF	DS;NS
9		Bluetooth communication	14 days	Fri 04.04.08	Thu 17.04.08	5	MK;RW
10		**Data storage and seach**	**42 days**	**Fri 04.04.08**	**Thu 15.05.08**		
11		Data storage	21 days	Fri 04.04.08	Thu 24.04.08	5	DS;OD;NS
12		POI search	21 days	Fri 25.04.08	Thu 15.05.08	11	OD;DS
13		Current track storage	14 days	Thu 01.05.08	Wed 14.05.08	20FS-7 days	DS;MK
14		**User interface**	**55 days**	**Fri 18.04.08**	**Wed 11.06.08**		
15		Configuration interface	7 days	Fri 18.04.08	Thu 24.04.08	8	DS;NS
16		Vector map display	28 days	Fri 25.04.08	Thu 22.05.08	11	DS;OD
17		Navigation	10 days	Tue 13.05.08	Thu 22.05.08	11;16FF	DS;OD
18		External data display	21 days	Thu 22.05.08	Wed 11.06.08	20;13;31SS+7 day	DS;OD;NS
19		Extra display functionality	10 days	Fri 23.05.08	Sun 01.06.08	16	DS;MK
20		**GPS communication**	**34 days**	**Fri 04.04.08**	**Wed 07.05.08**		
21		General	14 days	Fri 04.04.08	Thu 17.04.08	5	NS;RW
22		Bluetooth	11 days	Fri 18.04.08	Mon 28.04.08	21;9	NS;RW
23		LAPI	11 days	Fri 18.04.08	Mon 28.04.08	21	NS;RW
24		Serial	11 days	Fri 18.04.08	Mon 28.04.08	21	NS;RW
25		Simulator	11 days	Fri 18.04.08	Mon 28.04.08	21	NS;RW
26		Testing	9 days	Tue 29.04.08	Wed 07.05.08	22;23;25;24;15	NS;RW
27		**Communication with the server**	**36 days**	**Wed 23.04.08**	**Wed 28.05.08**	**54**	
28		Position sending	12 days	Wed 23.04.08	Sun 04.05.08		OD;RW
29		Buddy position requests	12 days	Wed 23.04.08	Sun 04.05.08		OD;RW
30		Parking tracking	7 days	Mon 05.05.08	Sun 11.05.08	28;29	
31		Testing	14 days	Thu 15.05.08	Wed 28.05.08	57;58;15;28;29;30	OD;RW
32		**Communication with the desktop**	**28 days**	**Fri 09.05.08**	**Thu 05.06.08**	**47**	
33		Implementation	21 days	Fri 09.05.08	Thu 29.05.08	11;9	MK;NS
34		Testing	7 days	Fri 30.05.08	Thu 05.06.08	33;48;15	MK;NS
35		Testing	14 days	Fri 06.06.08	Thu 19.06.08	11;16;12;20;27;32;	DS;MK;RW
36		Documentation	22 days	Fri 23.05.08	Fri 13.06.08	35SS-14 days	DS;MK;RW;OD;NS
37		**Desktop application - data preparation**	**77 days**	**Wed 26.03.08**	**Tue 10.06.08**	**1**	
38		Analysis	21 days	Wed 26.03.08	Tue 15.04.08	5SS	OD;NS
39		Analysis review	7 days	Wed 16.04.08	Tue 22.04.08	38	DS;MK;OD;RW;NS
40		Map cutting	21 days	Wed 23.04.08	Tue 13.05.08	39	OD;NS
41		Map indexing	14 days	Wed 14.05.08	Tue 27.05.08	39;40	OD;NS
42		POI indexing	14 days	Wed 14.05.08	Tue 27.05.08	39;40	OD;NS
43		Testing	14 days	Wed 28.05.08	Tue 10.06.08	40;41;42	DS;MK;OD;RW;NS
44		Documentation	14 days	Wed 28.05.08	Tue 10.06.08	43SS	OD;NS
45		**Desktop application - data transfer**	**58 days**	**Wed 16.04.08**	**Thu 12.06.08**	**1**	
46		Analysis	14 days	Wed 16.04.08	Tue 29.04.08	7SS	MK;NS
47		Analysis review	9 days	Wed 30.04.08	Thu 08.05.08	46	DS;MK;OD;RW;NS
48		Communication with the mobile	21 days	Fri 09.05.08	Thu 29.05.08	47	MK;NS
49		External data processing	21 days	Fri 09.05.08	Thu 29.05.08	47	MK;NS
50		Testing	14 days	Fri 30.05.08	Thu 12.06.08	48;49;33	DS;MK;OD;RW;NS
51		Documentation	14 days	Fri 30.05.08	Thu 12.06.08	50SS	MK;NS
52		**Server application**	**64 days**	**Wed 26.03.08**	**Wed 28.05.08**	**1**	
53		Analysis	21 days	Wed 26.03.08	Tue 15.04.08	5SS	RW;OD
54		Analysis review	7 days	Wed 16.04.08	Tue 22.04.08	53	DS;MK;OD;RW;NS
55		Data storage	8 days	Wed 23.04.08	Wed 30.04.08	54	RW;OD
56		Web interface	14 days	Thu 01.05.08	Wed 14.05.08	55	RW;OD
57		Receive/store	7 days	Thu 08.05.08	Wed 14.05.08	54;56SS+7 days	RW;OD
58		Process request/Send	7 days	Thu 08.05.08	Wed 14.05.08	54;56SS+7 days	RW;OD
59		Testing	14 days	Thu 15.05.08	Wed 28.05.08	57;58;28;29;56	DS;MK;OD;RW;NS
60		Documentation	14 days	Thu 15.05.08	Wed 28.05.08	59SS	RW;OD
61		Testing/Documentation review	7 days	Sat 14.06.08	Fri 20.06.08	36;44;51;60	DS;MK;OD;RW;NS
62		Final report	7 days	Sat 21.06.08	Fri 27.06.08	2;37;45;52;61	DS;MK;OD;RW;NS
63		Desired finish date	0 days	Fri 08.08.08	Fri 08.08.08
